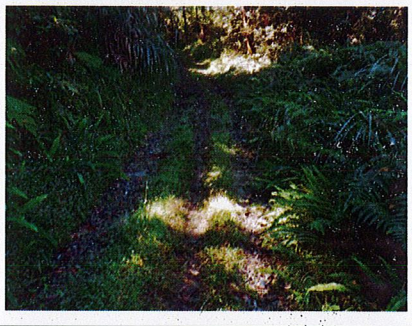
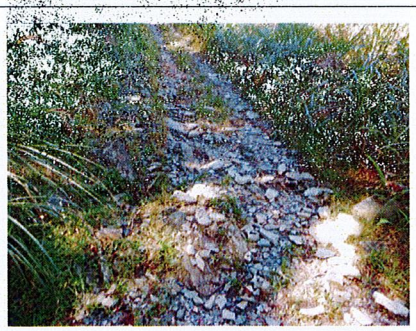
林業及自然保育署宜蘭分署林道巡查檢查表

金洋　林道巡查表

■一般巡查　□特別巡查　巡查人：技術士簡燦煇　填表日期：115 年 10 月 27 日

巡查項目	位置（里程）	巡查結果	照片	須處理情況
	1.2K	路面表土流失.切溝		
	3.1K	路面表土流失.切溝		
	5.6K	路面表土流失.切溝		
	7.0K	路面表土流失.切溝		

	7.4K	金洋林道雜草叢生		(1)神祕湖管制站至林道盡頭9K，雜草叢生覆蓋路面，待金洋村部落聯絡道路(雅告農路)改善工程完工後，再報請分署評估排除。
	7.9K	路面表土流失.切溝		
	8.7K	金洋林道雜草叢生		(1)神祕湖管制站至林道盡頭9K，雜草叢生覆蓋路面，待金洋村部落聯絡道路(雅告農路)改善工程完工後，再報請分署評估排除。
	8.8K	路面表土流失.切溝.石塊禿起		
擋土牆		無擋土牆設施		無
橋樑		無橋梁受設施		無
箱涵		無箱涵設施		無
地錨		無地錨設施		無
坡面		坡面一切正常		無

路殺		無發現路殺情形		無
標誌	0.0K	標誌牌正常		無
備註				

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 〔路殺〕定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。
6. 須處理情況部分，請參考下列項目填報：
   - 已由工作站自行排除。
   - 已報請維護單位排除。
   - 已報請管理處評估排除或修復。
   - 維護工作執行中「OO 工程名稱」

※於颱風前後、霪雨期間、豪大雨或地震(當地震度達 5 級)進行特別巡查。
